本管取り出しの場合の記入例

給水装置台帳

道路占用許可番号			
工事種別	①新設 2移動 3移口変 4改造 5口径変 6撤去 7臨時 8その他 9修繕	お客様番号	
図面番号	図面ページ	給水番号	
用途	1.生 ②.営 3.工 4.官 5.病 6. 7.浴 8.臨 9.専 0.果（農）	給水装置場所	佐久穂町大字高野町〇〇-〇
フリガナ	〇〇〇〇 〇〇〇〇		
申請者氏名	〇〇 〇〇		

量水器口径	Φ〇〇 mm	添付書類	家屋 土地 分岐 念書 寄付	所有者変更	年 月 日	氏 名	㊞
申込	令和 〇年〇月〇日	工事検査	円		. .		
許可	令和 年 月 日	分水立会	円		. .		
竣工	令和 年 月 日	耐圧立会	円		. .		
検査	令和 年 月 日	計	円		. .		

技術管理者	課長	課長補佐	係長	係	検査員

指定給水装置工事事業者

〇〇市〇〇＊＊＊－＊

（株）〇〇〇

代表取締役〇〇〇 〇〇 ㊞

（給水装置工事主任技術者 〇〇 〇〇 ）

平面図 （1/500）

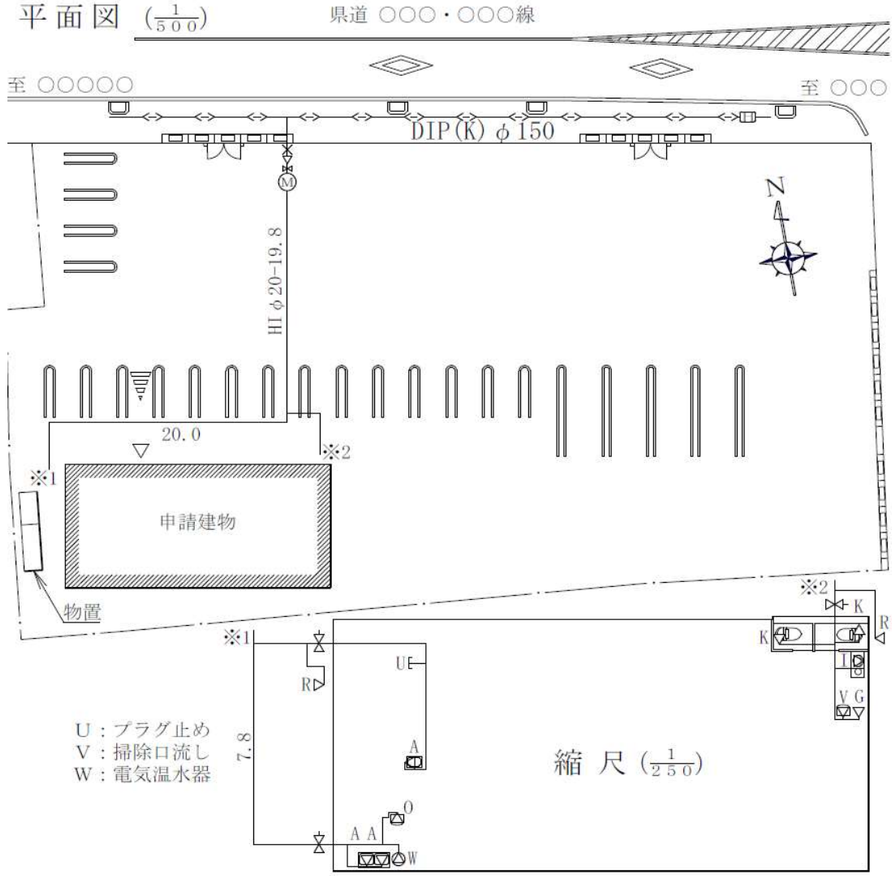

凡例

- 新設
- 既設
- 撤去・廃止
- 配水管
- 仕切弁
- 止水栓
- 逆止弁
- ストップバルブ
- 私設消火栓
- 防護管（さや管）
- 口径変更
- 水抜栓
- 管の交差
- 量水器 伸縮止水栓（逆流防止付）
- 減圧弁
- 一般用具
- その他
- 受水槽
- 高置水槽
- ポンプ
- 増圧ポンプ
- DCIP ダクタイル鋳鉄管
- CIP 鋳鉄管
- SSP ステンレス鋼管

VP 硬質塩化ビニル管	HIVP 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HI）	PP ポリエチレン管	SGP-VB 硬質塩化ビニル内面ライニング鋼管（VB）	SGP-VD 硬質塩化ビニル内外面ライニング鋼管（VD）
SGP-P ポリ粉体ライニング鋼管	GP 亜鉛めっき鋼管	CP 鋼管	ACP 石綿セメント管	STWP 塗覆装鋼管
XPEP 架橋ポリエチレン管	PBP ポリブテン管	SGP-HV 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	PbTW ライニング鉛管	

立面図

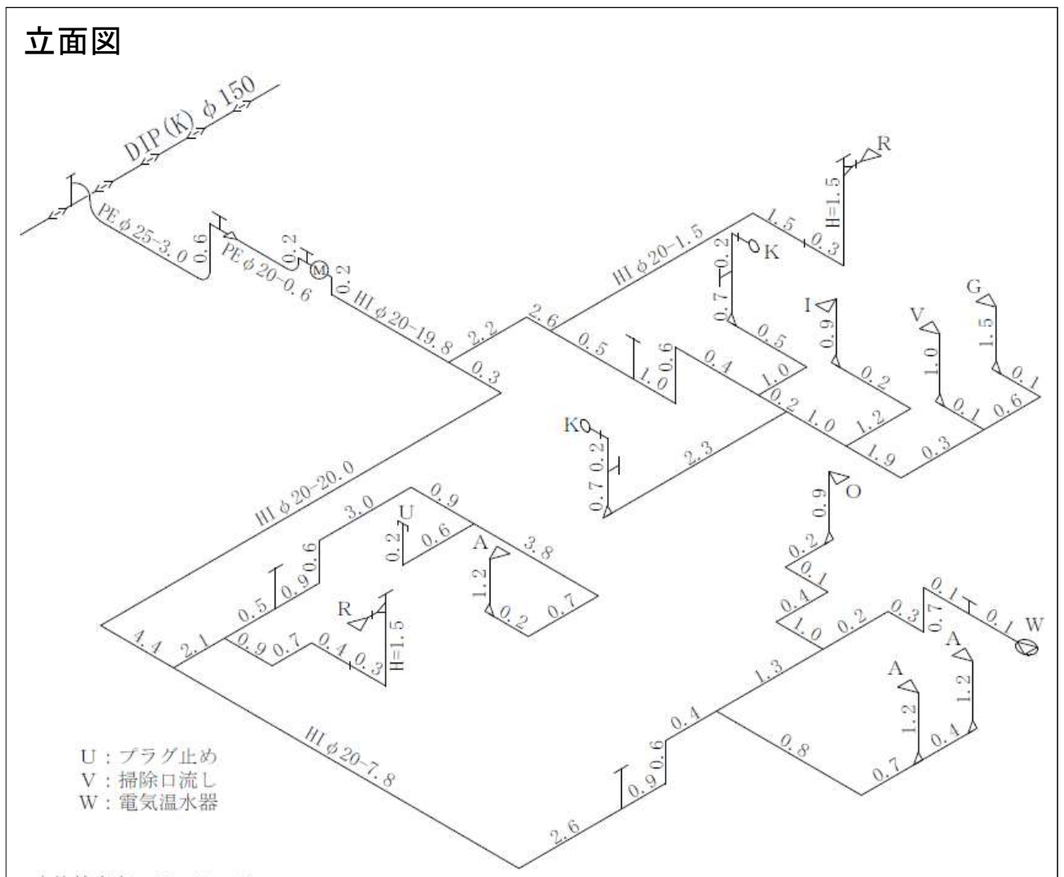

水抜栓高さ：H＝0．6

水抜栓以降、HIφ20、VD20A、VB20Aを使用

凡例：給水栓類／シャワーヘッド／フラッシュバルブ／ボールタップ／その他／水抜栓／地上不凍栓／ストップバルブ

位置図

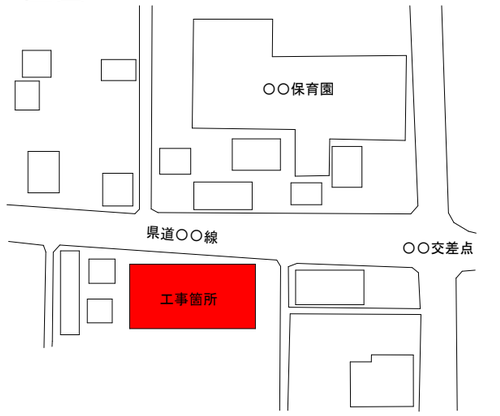
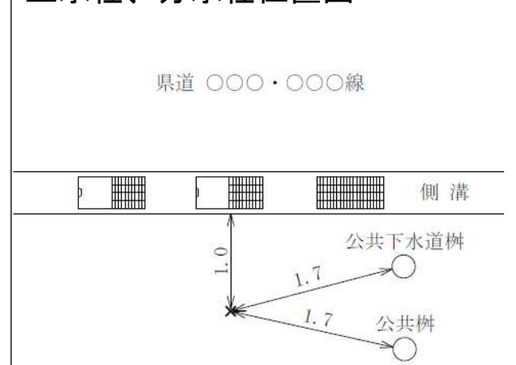
止水栓、分水栓位置図
